



Comité de Suivi des Travaux de déstockage

Réunion du 25 février 2015


Ordre du jour



- **Etat d'avancement des travaux de déstockage des déchets mercuriels et arséniés dans le Bloc 21**
- **Etat des quantités de déchets reconditionnés, remontés au jour et expédiés dans les Mines allemandes**
- **Prévision des travaux pour les semaines à venir**
- **Points divers.**

Généralités

Configuration du stockage





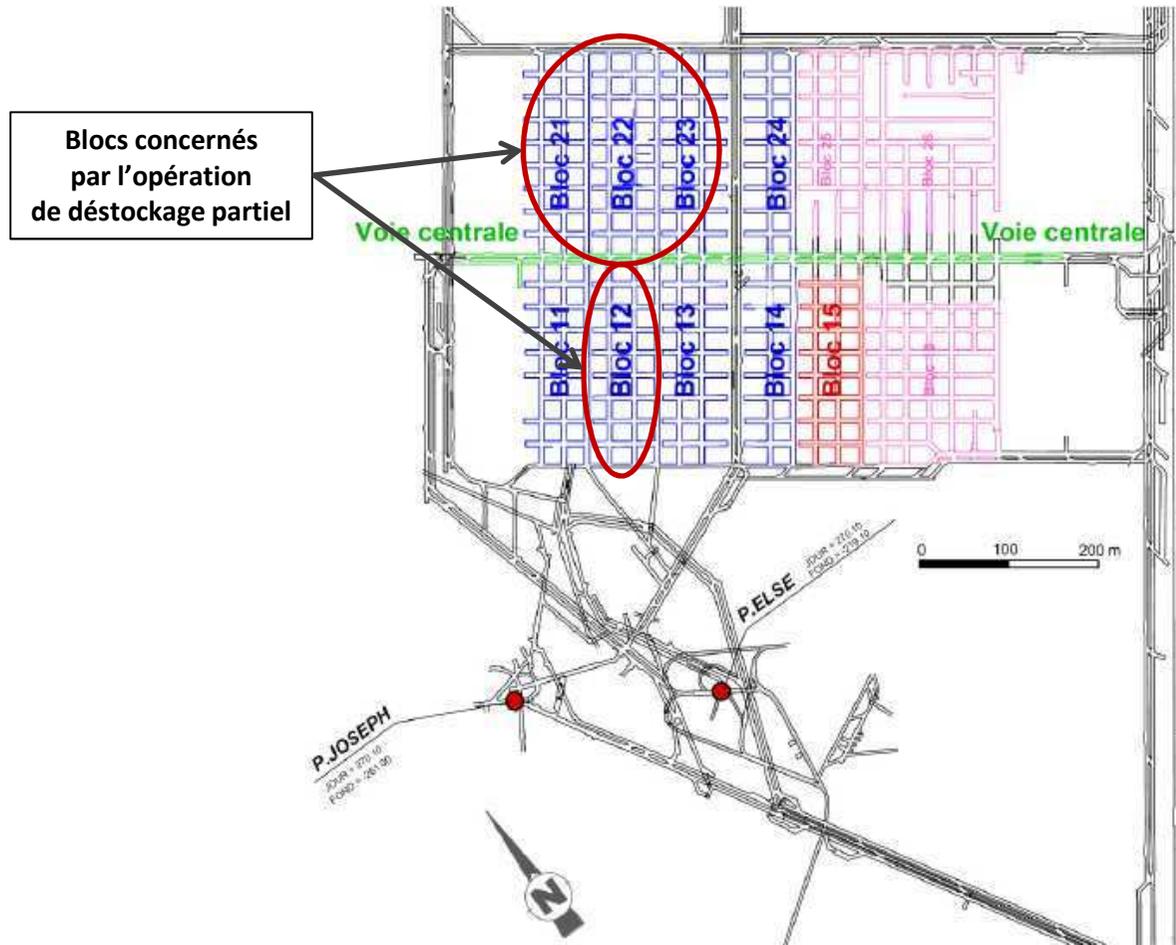


Généralités

Localisation des déchets à déstocker




	colis à déstocker			colis à déplacer		colis à déplacer pour 1 colis à déstocker
	nombre	masse (t)	masse Hg (t)	nombre	dont amiante	
Bloc 12	1 153	1 222	5,2	4 542	619	3,9
Bloc 21	1 986	2 252	6,8	1 676	0	0,8
Bloc 22	3 086	3 315	28,6	4 548	364	1,5
Bloc 23	1 722	1 727	7,0	4 490	967	2,6
Total	7 947	8 516	47,6	15 256	1 950	1,9

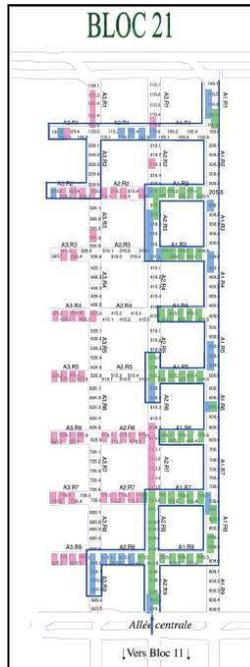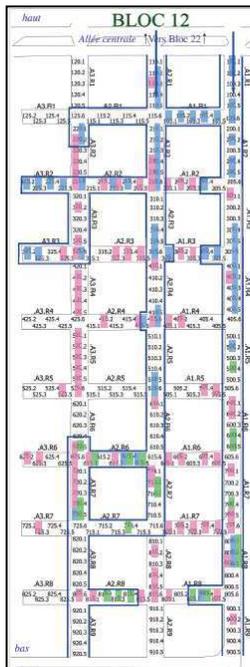


Etat d'avancement des travaux de déstockage

Situation au 20 février 2015

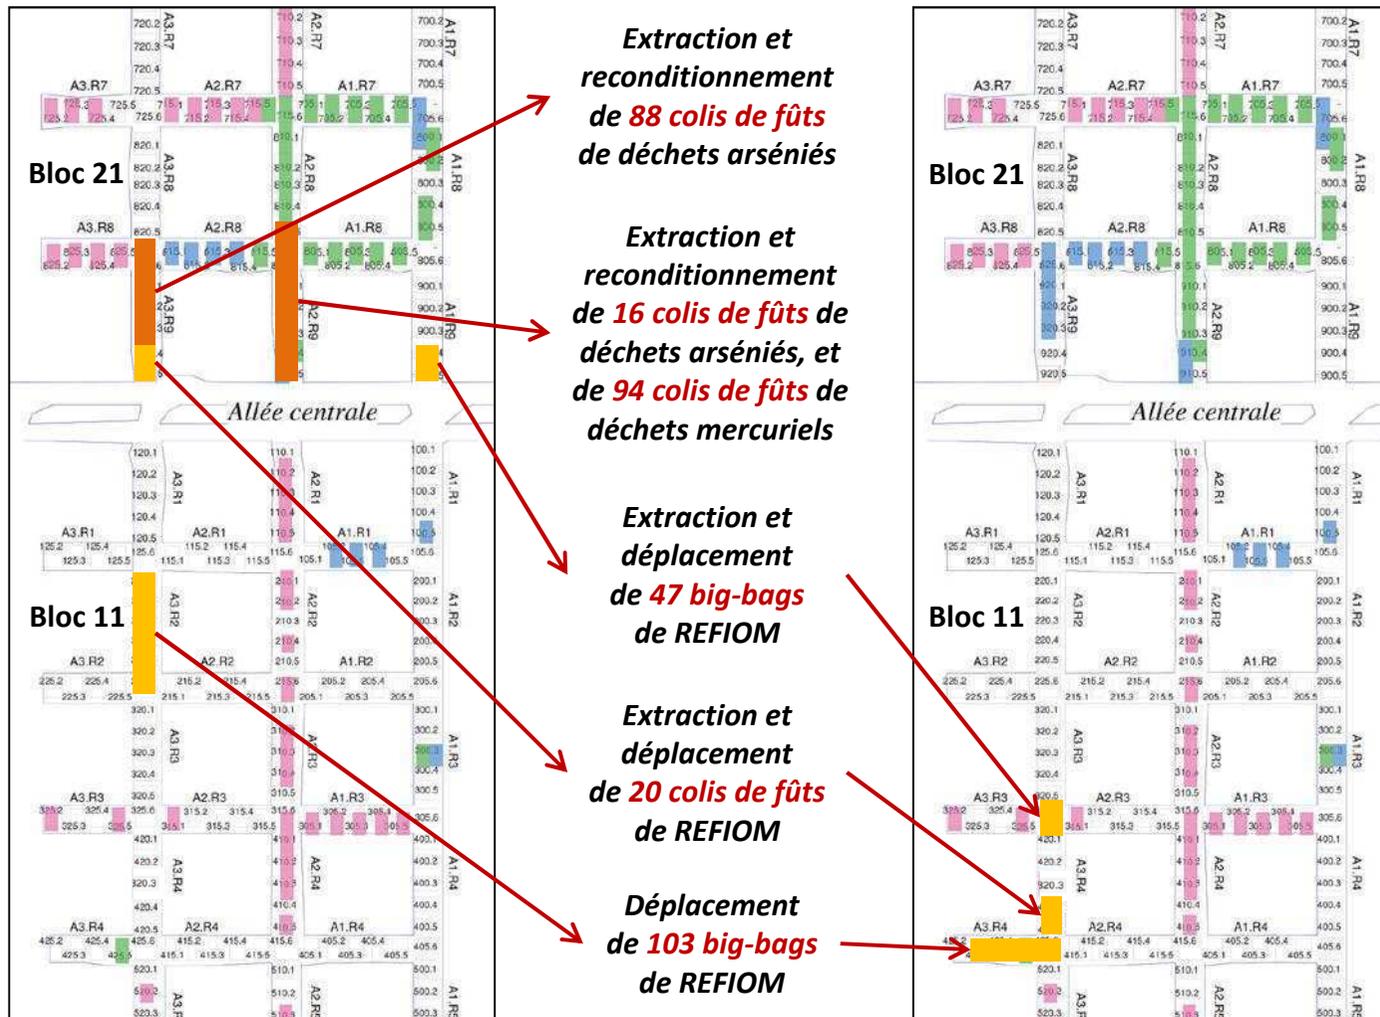

Etat d'avancement des travaux de déstockage

Situation au 20 février 2015

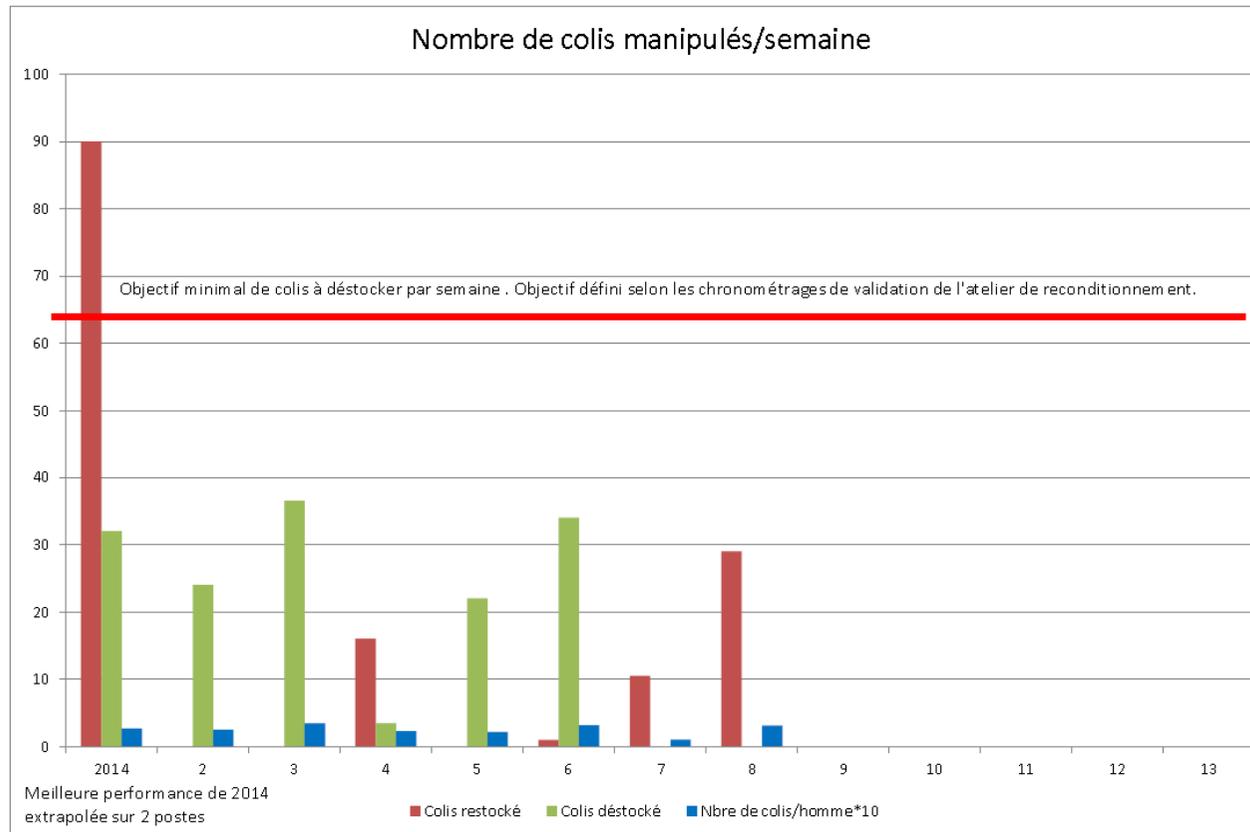


Etat d'avancement des travaux de déstockage

Reconditionnement des fûts de déchets mercuriel



Etat d'avancement des travaux de déstockage

Essai de soutirage des big-bags de REFION par aspiration

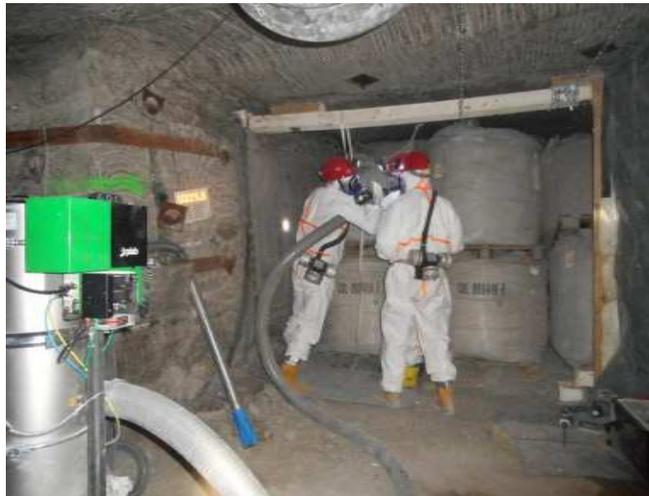

Etat d'avancement des expéditions

Situation au 20 février 2015




17 camions chargés
448 colis expédiés, dont :
108 conteneurs 3 fûts
340 palettes 2 sur-fûts
représentant 327 t



Prévision des travaux de déstockage


Phasage

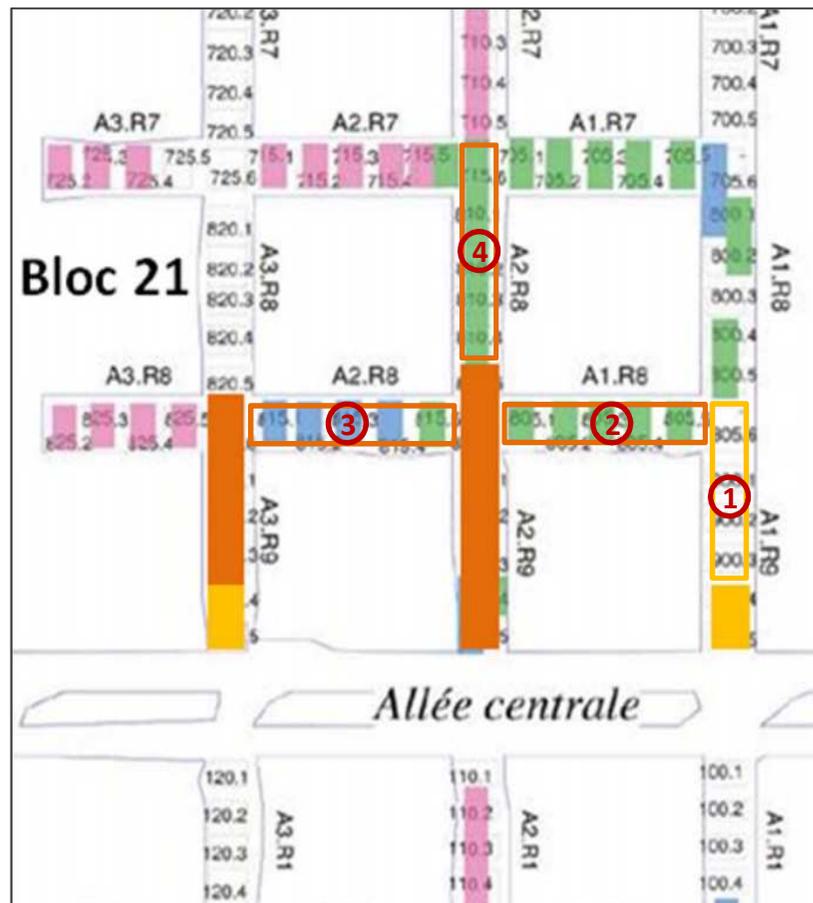

-  à déstocker
-  à déplacer


Prévision des travaux de déstockage


Aménagement de l'aire de reconditionnement

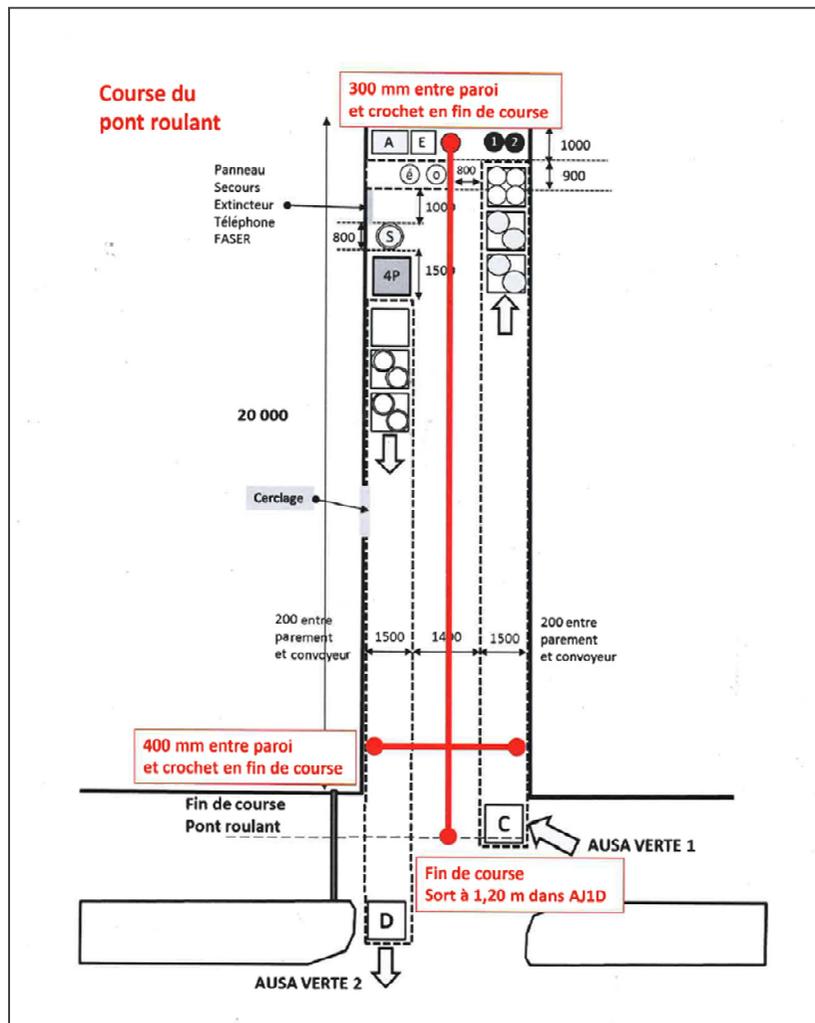

Prévision des travaux de déstockage

Mise en service de la nouvelle haveuse

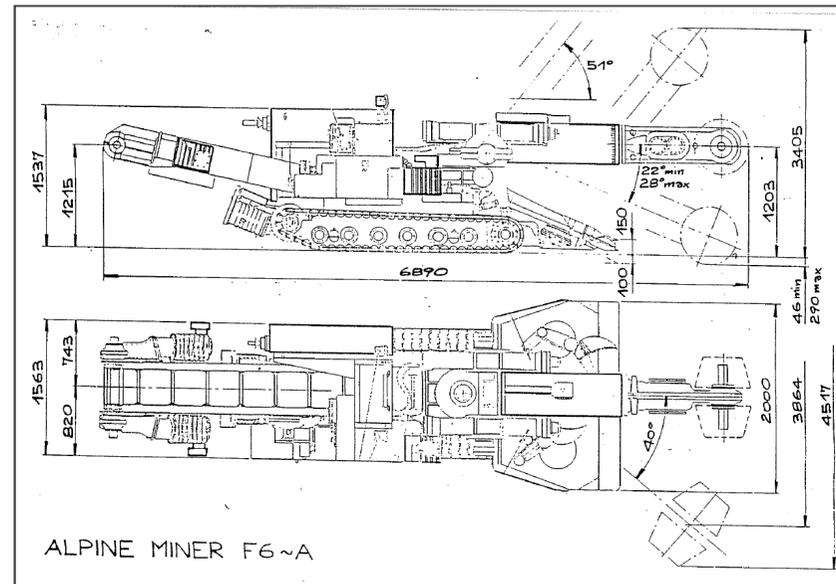



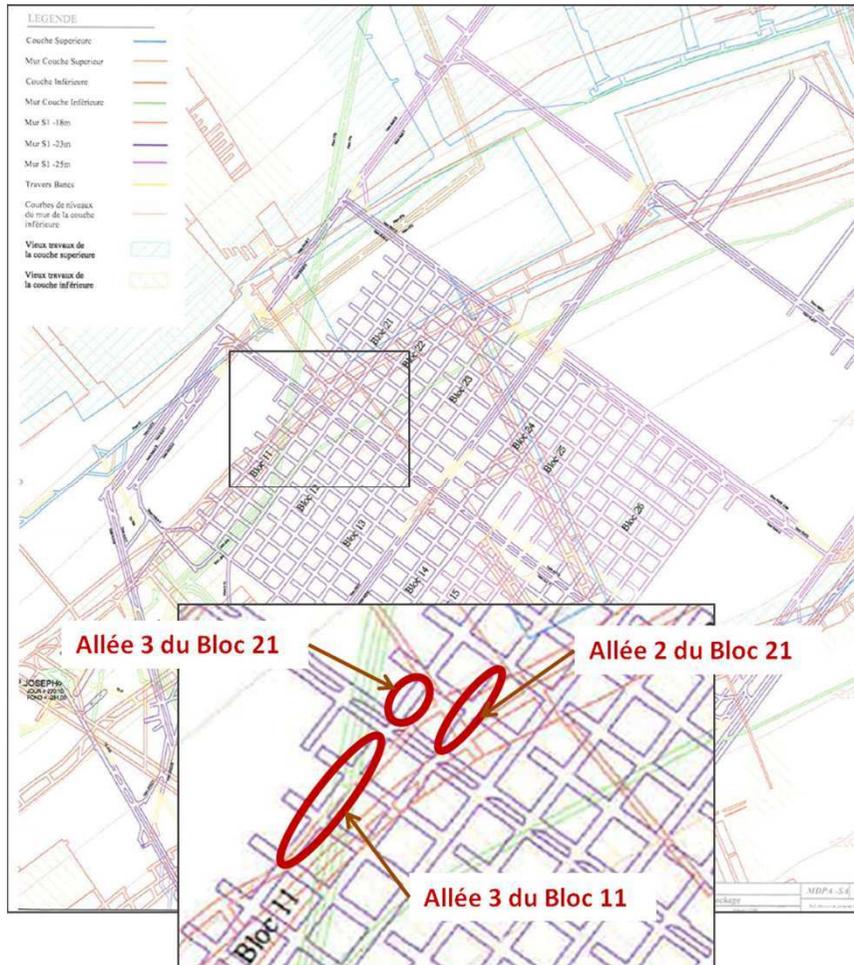


Les constats :

- Dans les 3 allées ouvertes, présence de fissures transversales à mi-longueur des piliers de 20 mètres
- Dans l'allée 3 du Bloc 21, désordres plus importants
- Dans 2^{ème} tronçon de l'allée 2 du Bloc 21, décollement du 1^{er} banc du toit





Situation dans l'allée 3 du Bloc 21

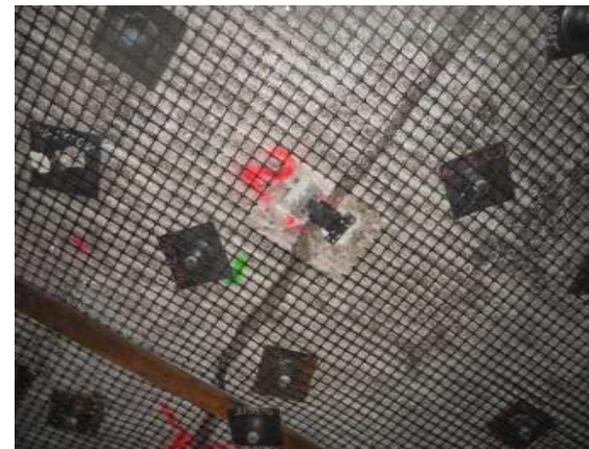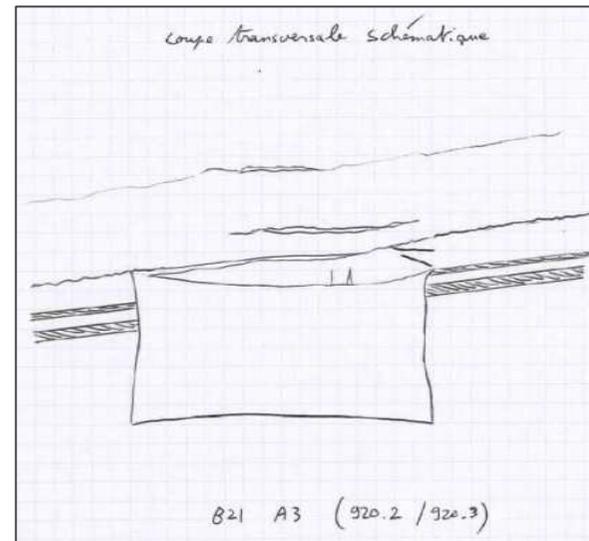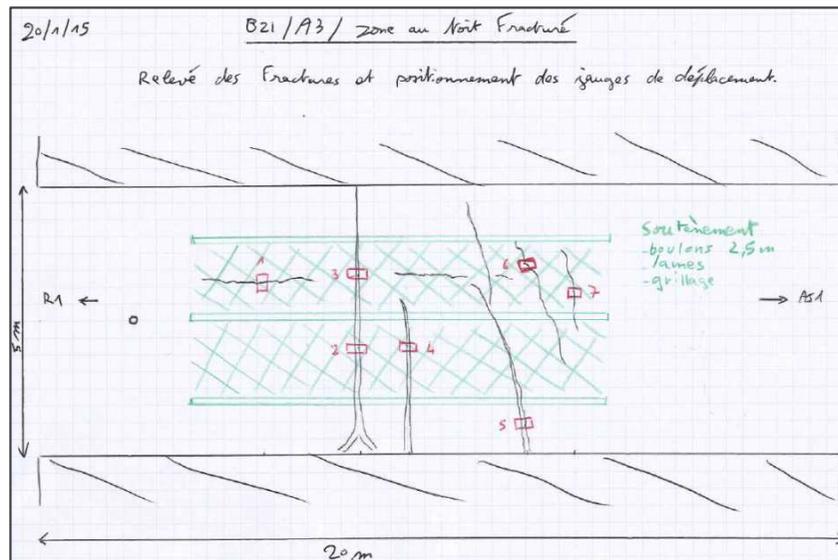



Situation dans l'allée 3 du Bloc 21

Endoscopie en sondage

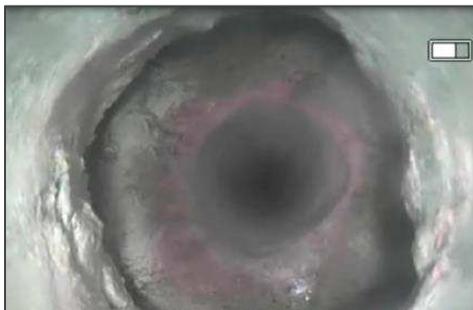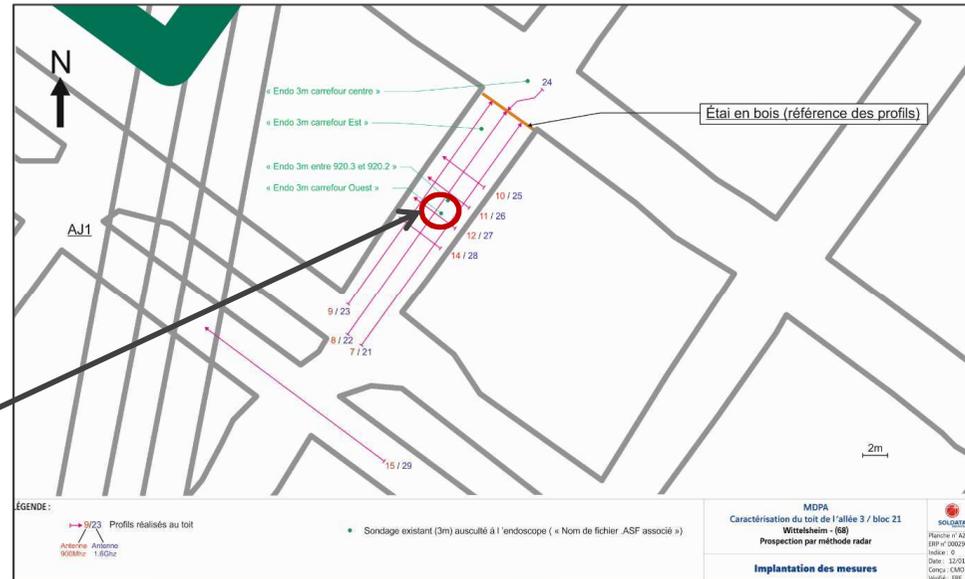

à 40 cm



à 60 cm



à 110 cm



Situation dans l'allée 2 du Bloc 21







Situation dans l'allée 2 du Bloc 21






Périmètres exploités en couche inférieure

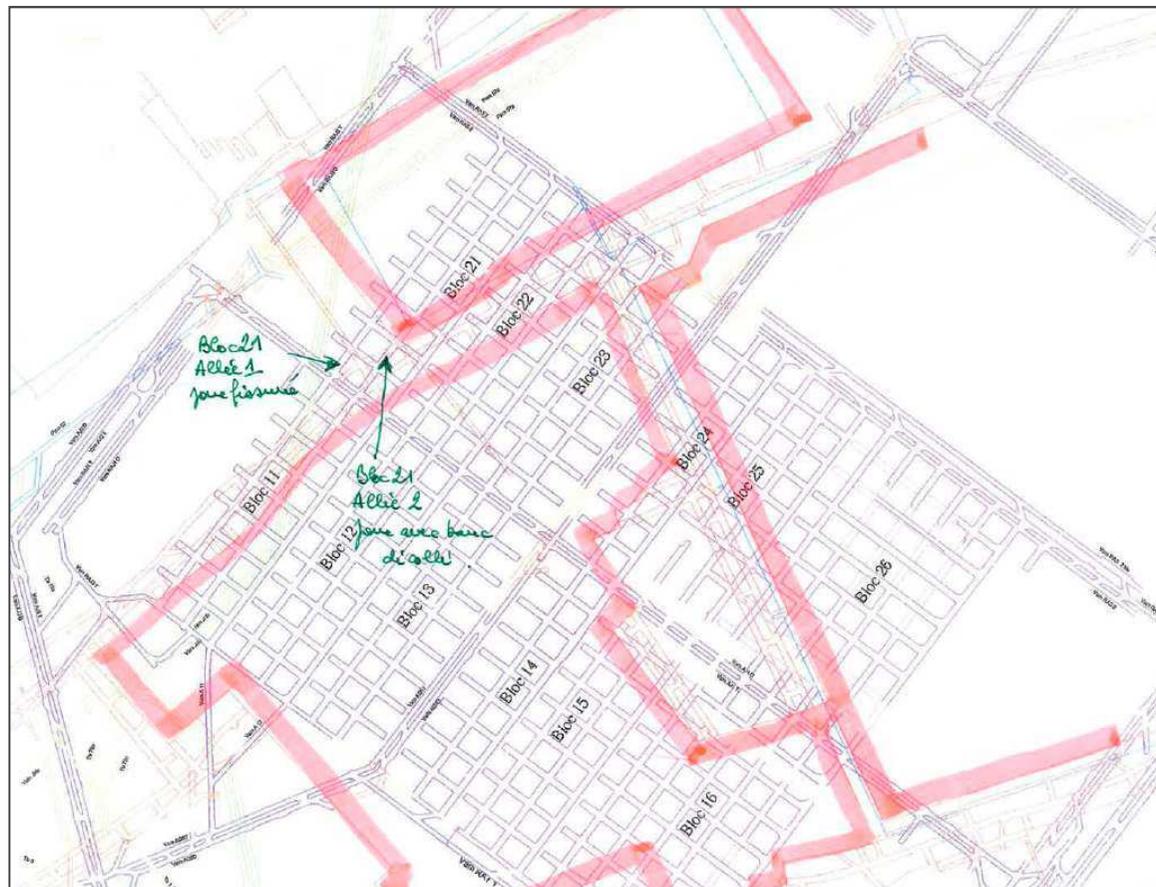

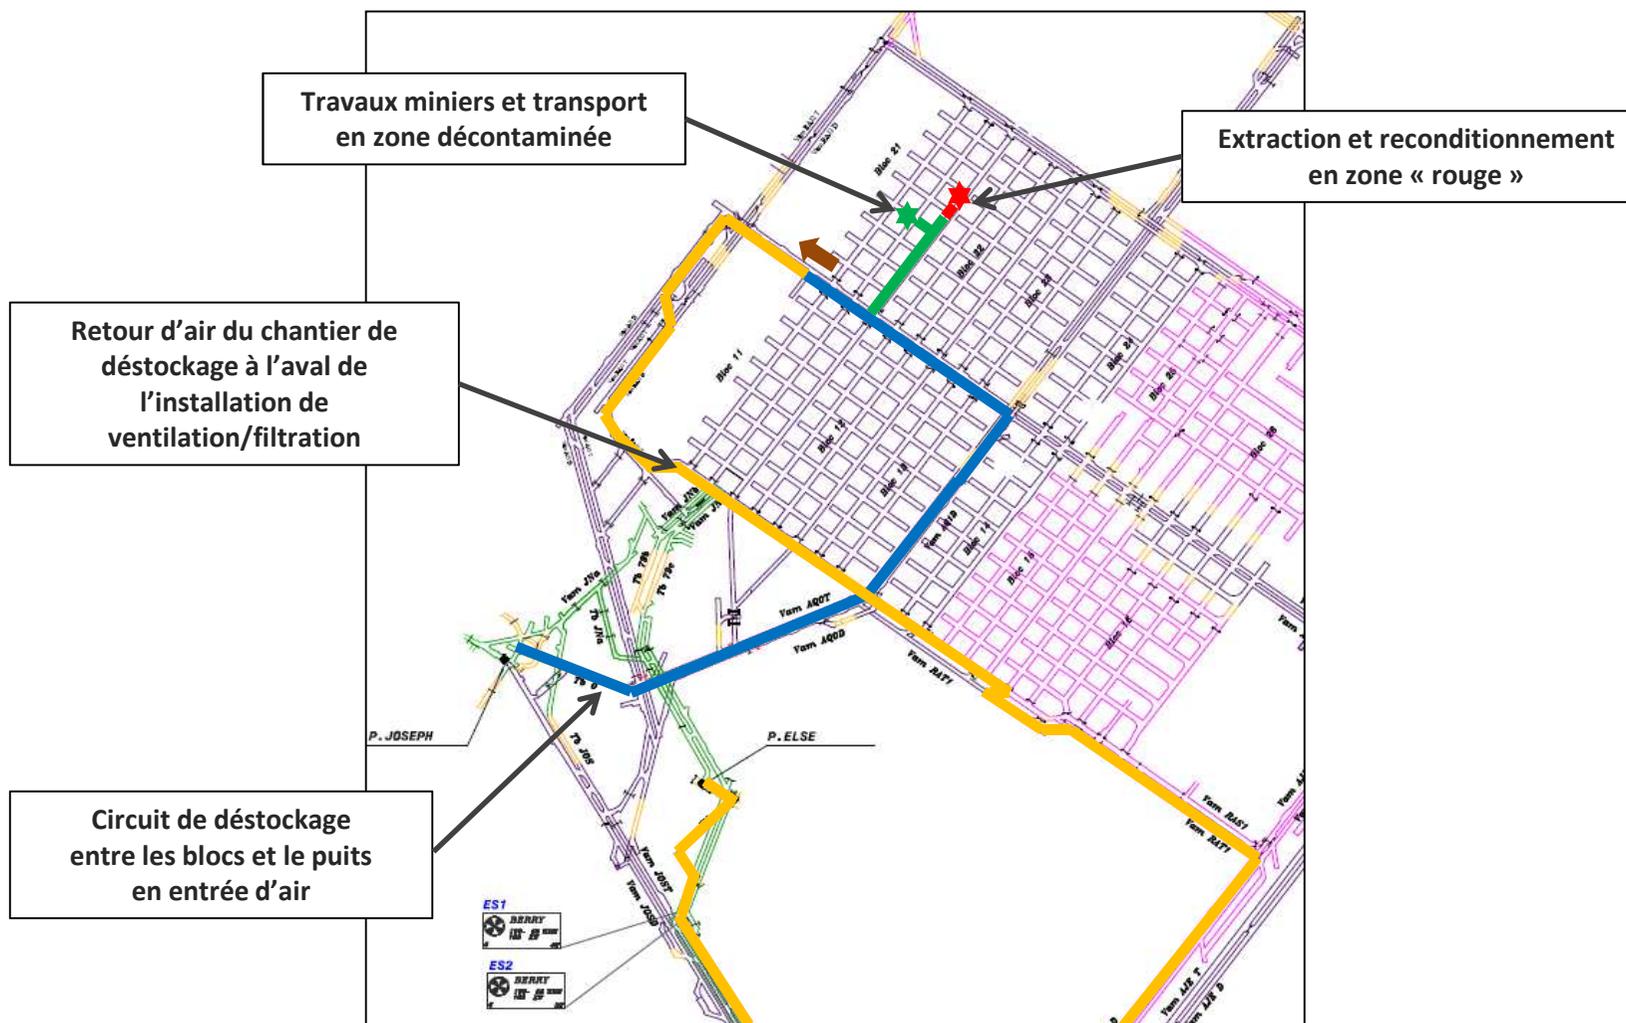

Divers

Surveillance de l'atmosphère

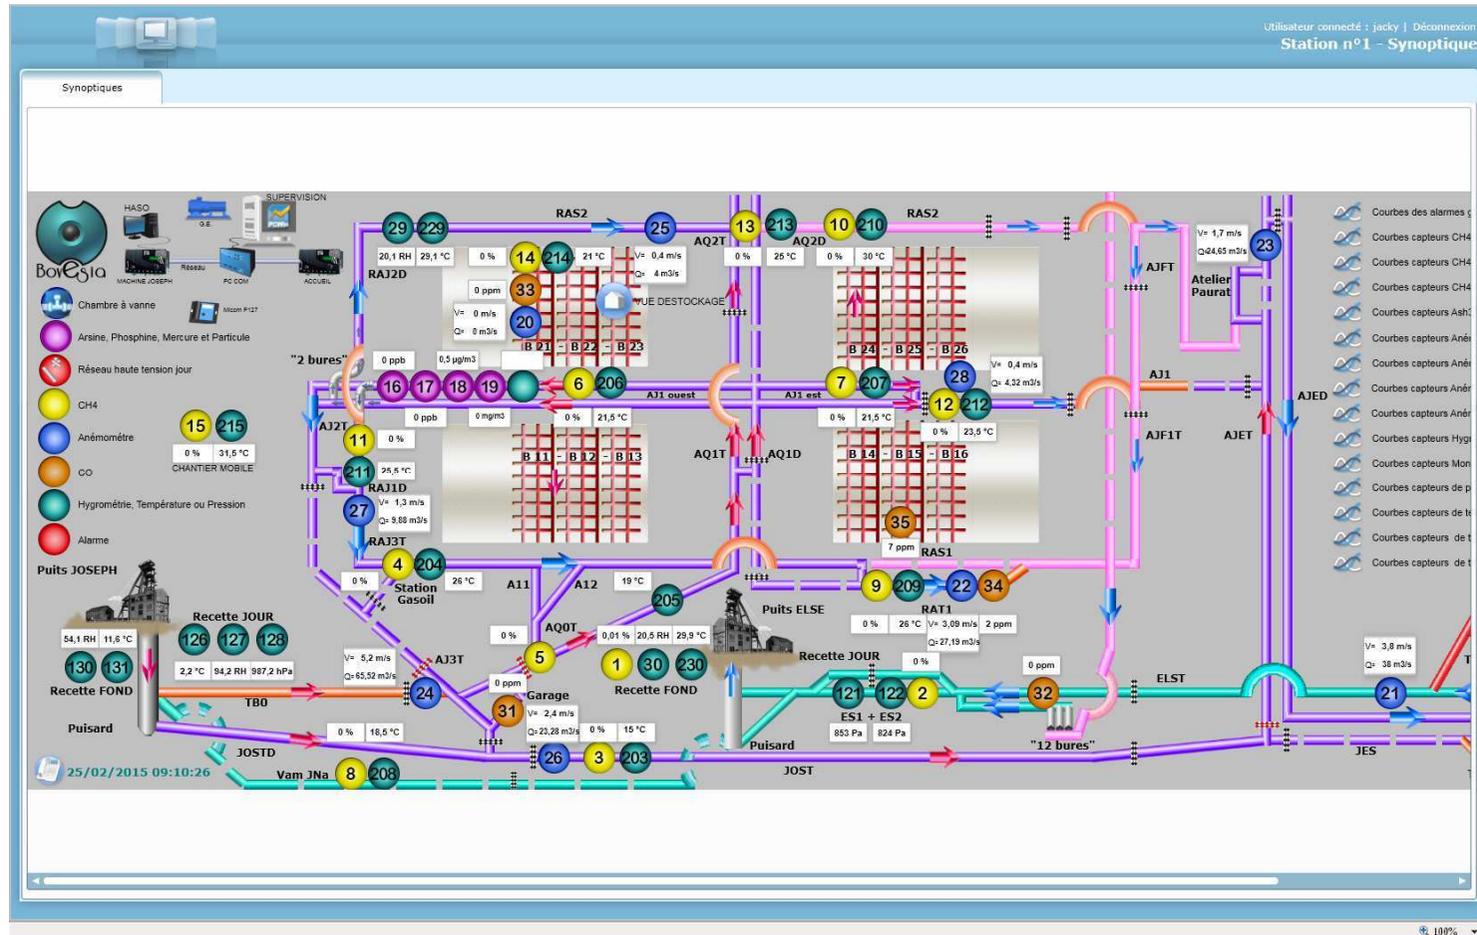



Merci de votre attention
